



Real-Water Team

építőipari, kereskedelmi és szolgáltató kft.

"D" TERVHEZ KIVITELEZÉS FOTÓI – MEGVALÓSULT ÁLLAPOT

Győr Ipari Park Blaguss csapadékátemelő kivitelezési munkái:


MOBA $\phi 2,0\text{m}$ - $H=4,50\text{m}$ – DN80 / D90 gépészettel szerelve FLYGT NP 3085 MT szivattyúval





Real-Water Team

építőipari, kereskedelmi és szolgáltató kft.

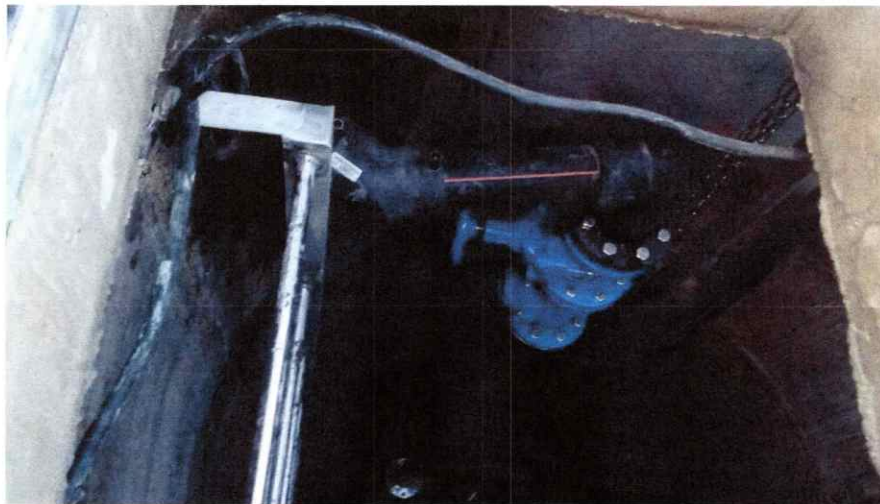

Műszaki tartalom:

- ✓ **1db MOBA E20 ϕ 2,0m, H=4,50m L_v =20cm, Átemelő akna építészeti kivitelezése** kütsüllyesztéses technológiával I-IV. oszt. talajban, víz alatti kotrással (gépi erővel történő munkavégzéssel), víz alatti betonozással, előregyártott MOBA E20-7 vb. talplemez és MOBA-ÜPE aknafének elem beépítésével, az átemelő vb. födémebe KO 3db D600 öv fedlapp beépítésével – Átemelő felúszás ellen méretezve
- ✓ **Átemelő akna belső gépészeti gyártását, helyszíni szerelése KO36 csövekkel, DN80 golyós visszacsapó szelep és tolózár beépítésével.** Az átemelőben a nyomócső és a vezetőcsővek anyaga KO36 (1.4541 v. 4404) acélcső. A szerelési határ átemelő aknán kívül D90 KPE nyomócsővel megállva + 1db KO látra gyártása és beépítése
- ✓ **1db Flygt NP 3085 MT 460 DN80 szivattyú** terv szerint talpidom, vezetőcső tartó
- ✓ **1db Kültéri RTC-2 Direkt indítású elektromos vezérlőszekrény** KO tartószerkezettel, 2db úszókapcsolós szintvezérlésre, 1db úszókapcsolós vész-bejeltéssel, terv szerint átemelő mellé telepítve, beüzemelve

Készült: 2019. december 09.

RWT KFT.
2800 Talabánya, Fő tér 20.
Tel./Fax: 34/312-789
Adószám: 11764245-2-11


Beszkidjár Zsolt
