MEGVALÓSULÁSI TERV - KIVITELEZÉS FOTÓI

Dunaalmás Erdősor úti átemelő gépészeti felújítása
Felújítás előtti állapot

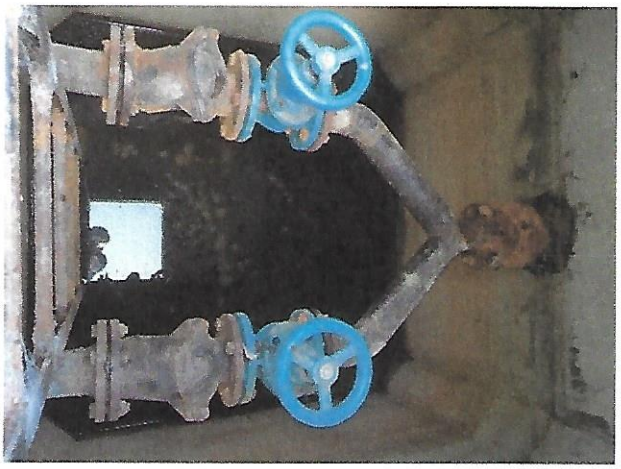

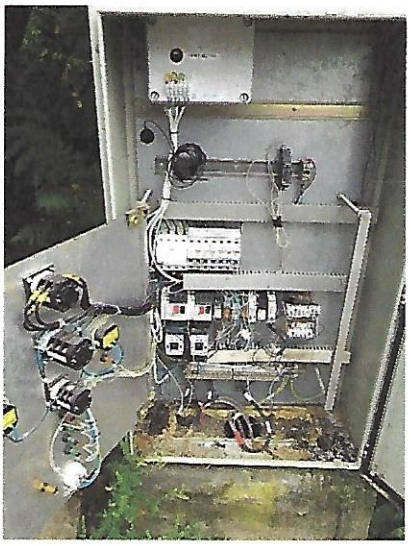

MEGVALÓSULÁSI TERV - KIVITELEZÉS FOTÓI

„D" TERV MEGVALÓSULT ÁLLAPOT
Felújítás, kivitelezés képei

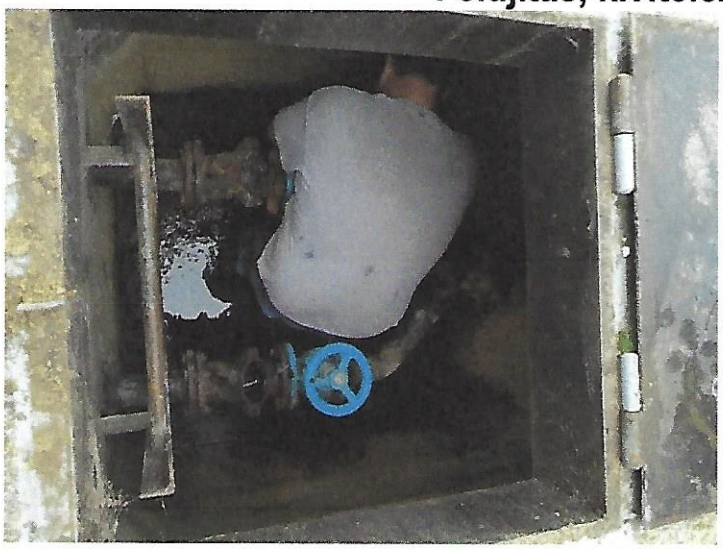

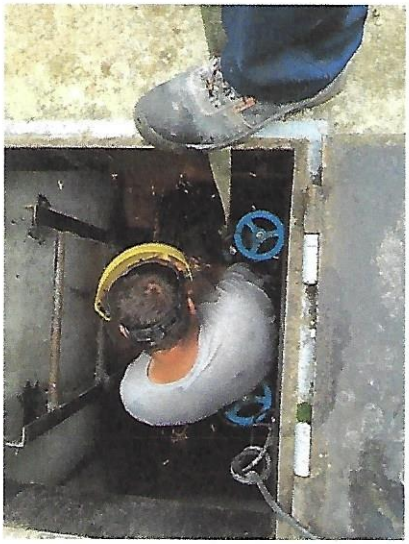

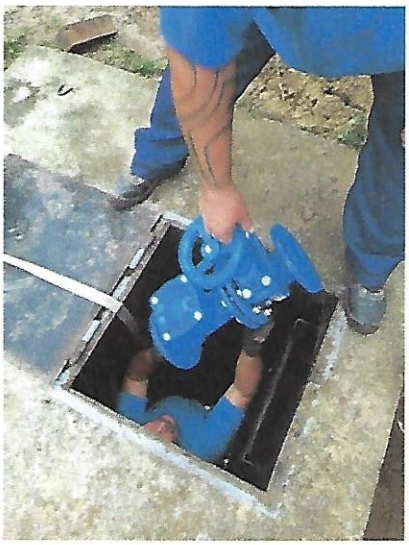

MEGVALÓSULÁSI TERV - KIVITELEZÉS FOTÓI

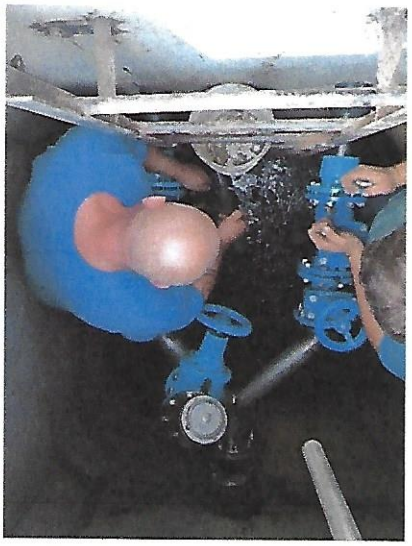

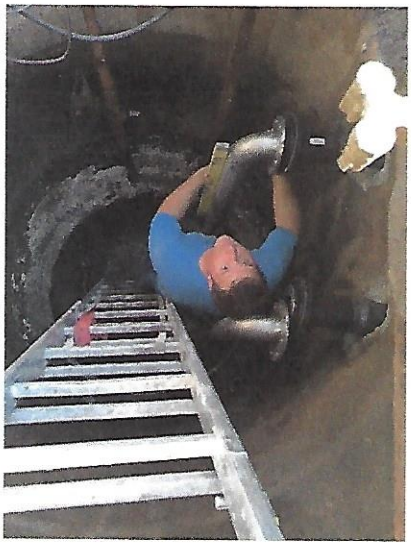
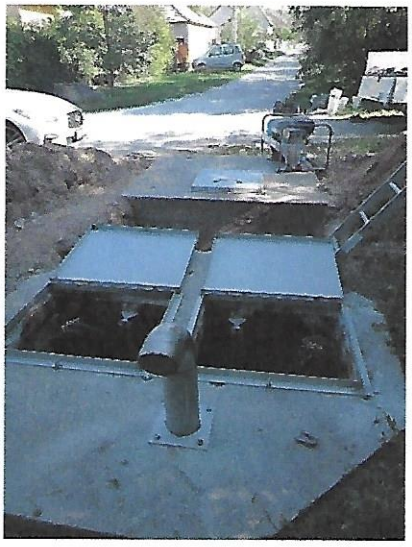

MEGVALÓSULÁSI TERV - KIVITELEZÉS FOTÓI

***Átemelő gépészeti és lakatos szerkezetek cseréje, kivitelezés menete:* 2018. 09.05 – 07. között**

1 NAP:

1. Szerelvényaknán belüli gépészet bontása
2. 1db DN80 KO36 anyagból karimás kötéssel közösítő Y-idom gyártása és beépítése meglévő nyomócső karimájához csatlakozva
3. A meglévő közösített nyomóvezeték ágon provizor csatlakozási pont kiépítése DN80 KO csonk + tolózár
4. 2db Új DN80 tolózár + golyós visszacsapó + 1db gumi kompenzátor beépítése szerelvényakna közös nyomócső ágába
5. A jelenleg még működő ág vissza kötése egyszivattyús automata üzem visszakapcsolása
6. Átemelő- és szerelvényakna közötti összekötő vezeték kiszereléséhez kézi földmunkával vezeték feltárása

2. NAP:

7. Az akna mosatása, tisztítása a bontási munkák megkezdése előtt. Szippantás a gravitációs hálózatból dugózás után.
8. Átemelő belső gépészeti bontása, összekötő vezeték kibontása, aknafalak vésése
9. Átemelő- és a szerelvényakna között földben lévő acél nyomóvezeték bontása és kiszerelése
10. Új KPE D90 PE100 SDR17 szennyvíz nyomócső beépítése átemelő- és szerelvényakna között, befalazó idommal, DN80 ISO húzás-biztos karima és EF karmantyú+hegtoldat+PP karima beépítésével
11. Átemelőben Új DN80/88,9*3,0mm KO36 nyomóvezeték, 2db DN80 90° csőiv KO36 (1.4541 v. 4404), 2db DN80/50 KO szűkítő, 2" KO (316) hollender és menetes csővég beépítése karimás kötéssekkel
12. 2db Flygt DN50 Talpas idom, és 3/4" KO Vezetőcső tartó beépítése + 2*2db Vezetőcső 3/4"-os KO36 (1.4541 v. 4404) beépítése
13. 2db új motorkábel tartó és 1db úszókapcsoló tartó beépítése KO minőségben
14. Átemelő aknán 2db 600*700mm ajtó + keret és Szerelvényaknán 1db 600*600mm ajtó + keret cseréje KO hajtott kivitelűre
15. Átemelőre új DN100 KO szellőzőcső beépítése (régi szellőző kibontása) + EPH laposvasak cseréje KO minőségűre
16. Szereléshez M16*60 és M16*70 A2/A4 csavarok, anyák és lapos alátétek, DN80 IT tömítések, segédanyagok.

3. NAP:

17. Aknák közötti föld visszatöltése, tömörítése, terület rendezése és betonfelületek javítása ajtókeretek kivésésénél és kibontásánál

RWT KFT.
2800 Tatabánya, Fő tér 20.
Tel./Fax: 34/312-789
